

Sprint Review Report — Sprint 1

Music Playlist Manager

Gruppo 04 | Corso: Software Architecture Design | A.A. 2025/2026

Sprint	Data inizio	Data fine	Durata
Sprint 1	28 maggio 2026	04 giugno 2026	1 settimana

Story Points: Pianificati vs Completati

User Story	SP Pianificati	SP Completati	Stato
US01 — Creazione Tracce	3	3	Completata
US02 — Modifica Tracce	3	3	Completata
US03 — Eliminazione Tracce	3	3	Completata
US04 — Visualizzazione Tracce	3	3	Completata
US05 — Creazione Playlist	3	3	Completata
US06 — Rinomina Playlist	3	3	Completata
US07 — Eliminazione Playlist	3	3	Completata
US08 — Aggiunta Brano a Playlist	3	3	Completata
US09 — Eliminazione Brano da Playlist	3	3	Completata
US18 — Refresh Automatico Catalogo	5	5	Completata
US20 — Refresh Automatico Playlist	5	5	Completata
Totale	37	37	—

Velocity Sprint 1: 37 SP completati su 37 pianificati. Trattandosi del primo sprint, questa velocity verrà usata come riferimento per la pianificazione dello Sprint 2.

Problemi Implementativi

- **Mancanza di convenzioni di denominazione:** il team non aveva concordato preventivamente se usare l'inglese o l'italiano per i nomi di metodi, variabili e attributi. Questo ha causato inconsistenze tra le classi sviluppate dai diversi membri richiedendo refactoring. Per gli sprint successivi il team ha concordato di usare **l'inglese** per tutti i nomi nel codice e **l'italiano** per i commenti e la documentazione.

Problemi sul Product Backlog

- L'unico problema riscontrato, ma che abbiamo prontamente risolto, è stato l'uso di User Stories troppo complesse. Tuttavia, abbiamo provveduto a cambiarle già dalla fase di Pre-Game.

Code Review

Revisore	Autore	Classi da revisionare
Luigi	Annamaria	PlaylistController (T06), PlaylistDetailViewController (T13, T14), MainViewController (T15), PlaylistControllerTest (T20)
Francesco	Luigi	TrackImpl (T01), TrackController (T04), TrackFormPanel (T07, T08, T09), TrackImplTest (T16), TrackControllerTest (T19)
Gioia	Francesco	MusicCatalog / ConcreteMusicCatalog (T02), CatalogObserver, CatalogEvent, CatalogEventType, TrackListViewController (T10), MusicCatalogTest (T18)
Annamaria	Gioia	PlaylistImpl (T03), PlaylistController base (T05), PlaylistPanel (T11, T12), PlaylistImplTest (T17)

Burndown Chart Sprint 1

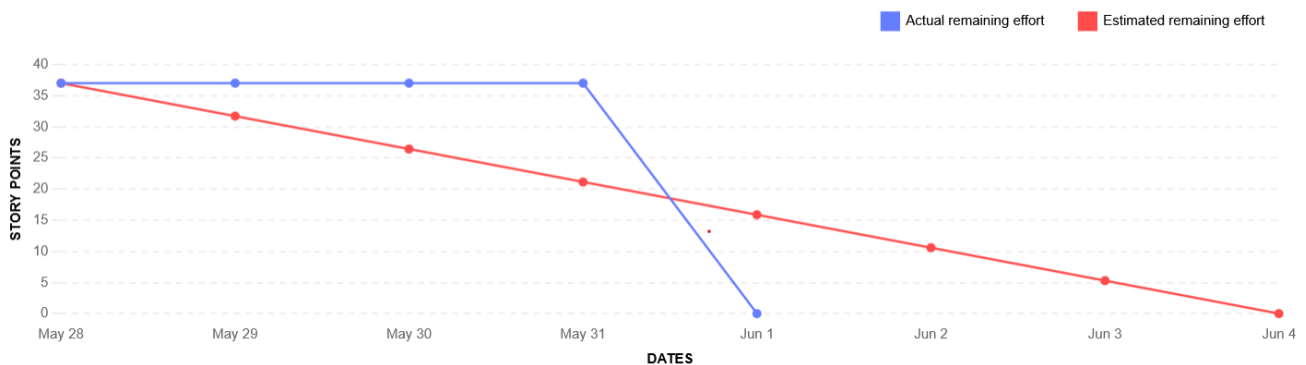


Figura 1: Burndown Chart Sprint 1

Extended Burndown Chart

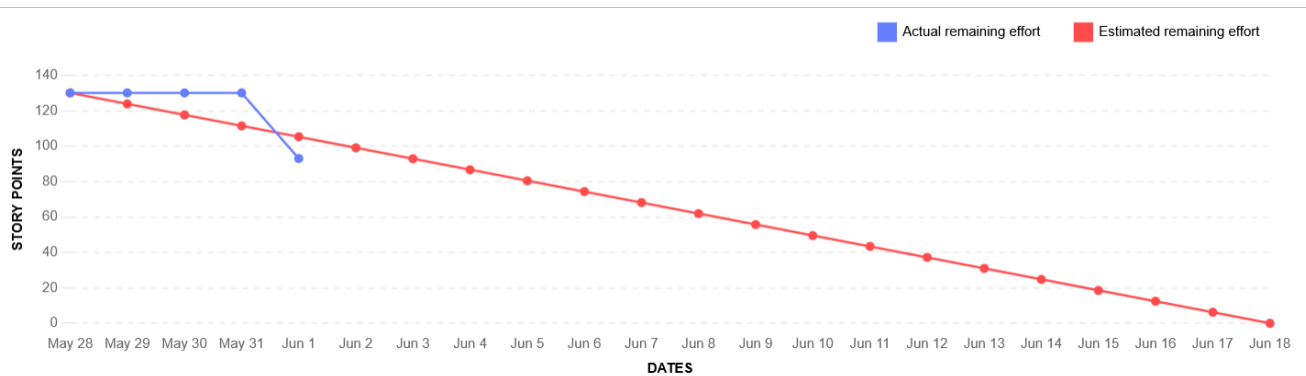


Figura 2: Extended Burndown Chart

Starfish Diagram

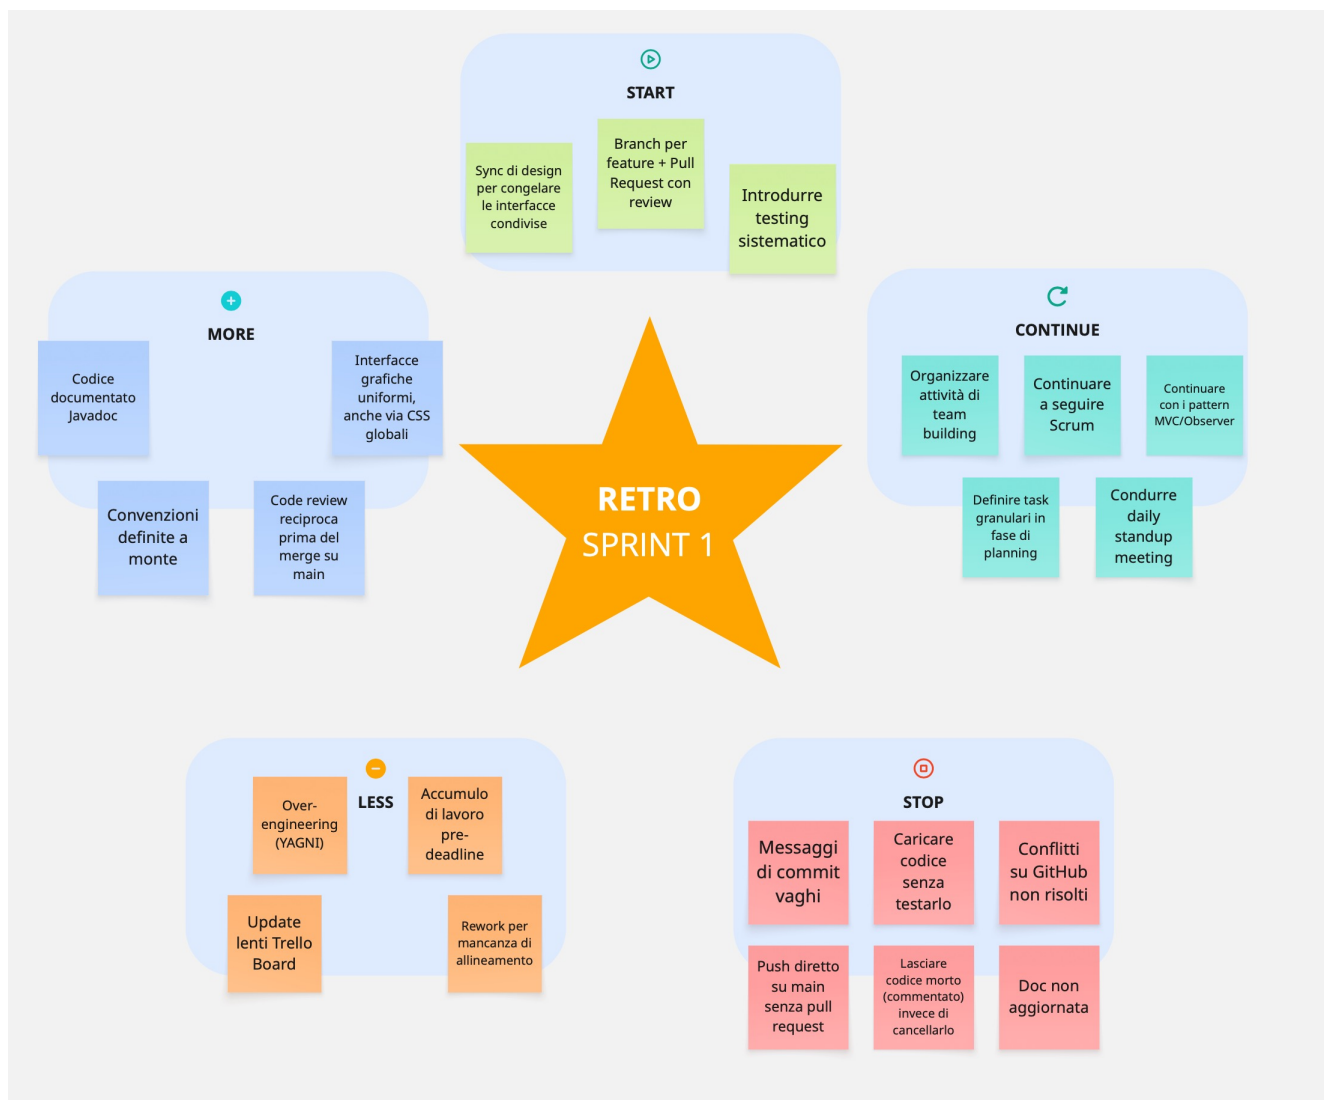


Figura 3: Starfish Diagram Sprint Retrospective 1

Action item (Sprint 1 → Sprint 2)

Dalla retrospective sono emersi i seguenti impegni operativi per lo sprint successivo:

Azione	Criterio di completamento
Branch per feature + Pull Request: niente push diretto su <code>main</code> ; ogni feature su un branch, merge solo tramite PR con almeno una review.	Zero commit diretti su <code>main</code> durante lo sprint.
Sync sulle interfacce: prima di implementare i moduli che si toccano, 15 minuti per congelare firme, ritorni ed eccezioni.	Le interfacce condivise non cambiano a metà sprint.
