

Sprint Retrospective Report — Sprint 2

Music Playlist Manager

Gruppo 04 | Corso: Software Architecture Design | A.A. 2025/2026

Sprint	Data inizio	Data fine	Durata
Sprint 2	4 giugno 2026	11 giugno 2026	1 settimana

Nota: La retrospettiva si concentra esclusivamente sul **processo** adottato durante lo sprint, non sul prodotto realizzato. Le osservazioni seguono il modello *Starfish Diagram* (Start / More / Continue / Less / Stop). Per ogni voce è riportata l'attività concreta che ne è risultata.

Starfish Diagram

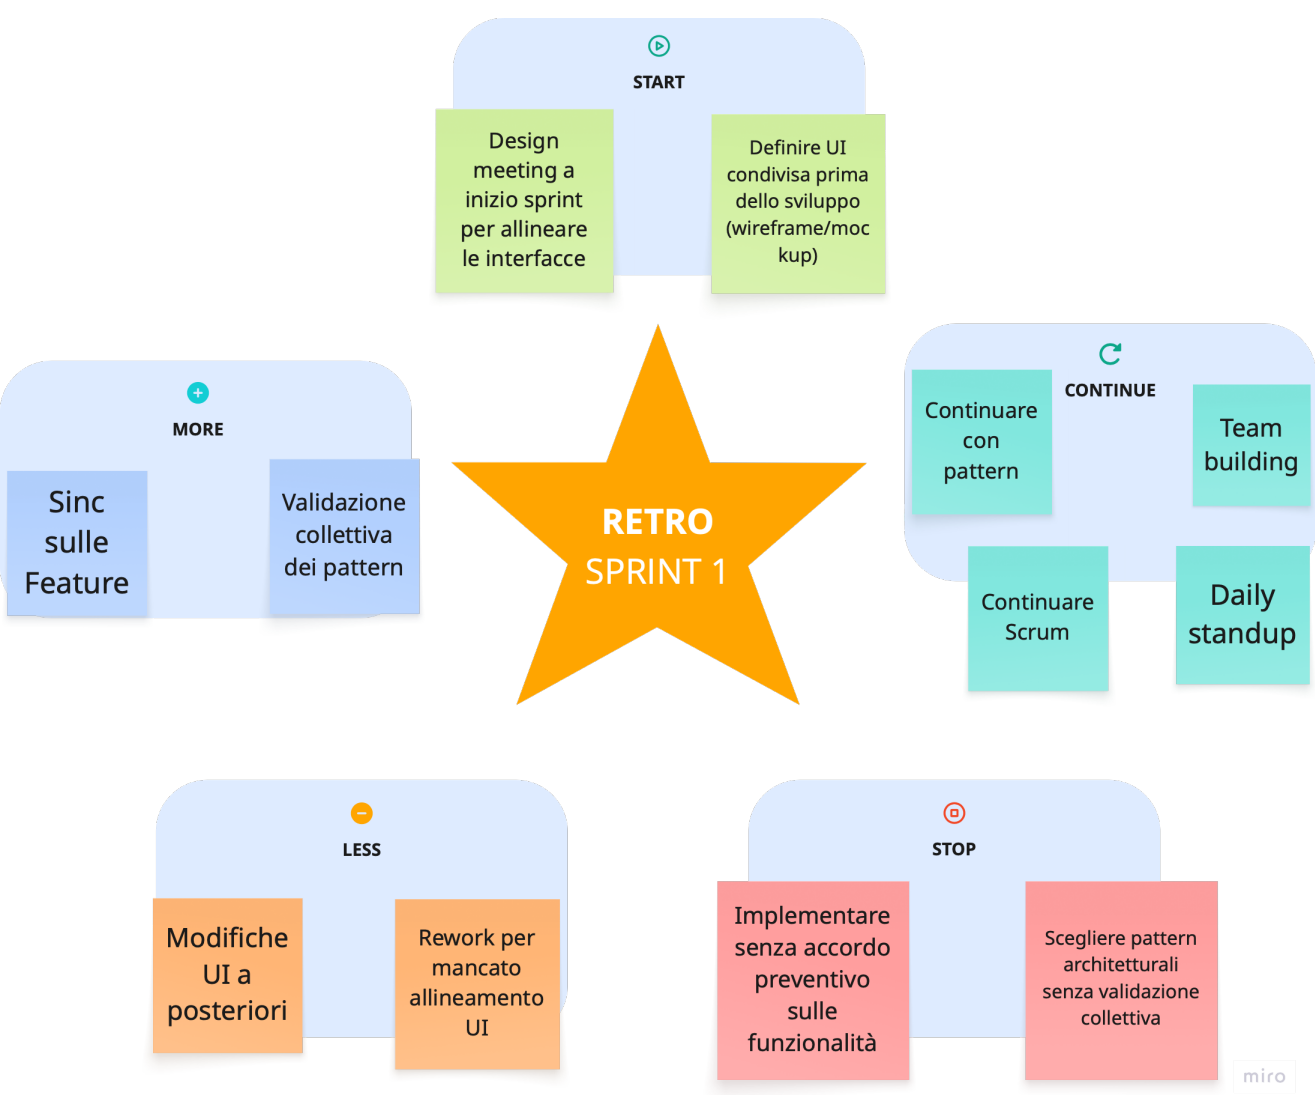


Figura 1: Starfish Diagram — Sprint Retrospective 2

STOP *Cosa dobbiamo smettere di fare*

Iniziare l'implementazione senza aver concordato prima le funzionalità complete con tutto il team.

→ Ha portato all'aggiunta in corso di sprint di US28 (Skip Playlist Intera), con conseguente ricalcolo della velocity e aggiornamento del Product Backlog a sprint già avviato.

Scegliere pattern architetturali individualmente senza validarli collettivamente prima dello sviluppo.

→ Il pattern Composite era stato considerato per la gerarchia sorgenti/tracce, ma si è rivelato non necessario per una gerarchia fissa a due livelli; sostituito con l'interfaccia PlayableSource, con conseguente refactoring.

LESS *Cosa dobbiamo fare meno*

Modifiche a posteriori alla UI per allineare le scelte grafiche tra i membri del team.

→ I bottoni di selezione della strategia (Sequential, Shuffle, Loop) erano stati inizialmente inseriti nel dettaglio playlist e nel catalogo playlist; spostati nella barra di riproduzione dopo un accordo raggiunto a sprint in corso.

Rework architetturale dovuto alla mancanza di accordo preventivo sulla struttura dell'interfaccia.

→ Refactoring di PlaylistDetailViewController e PlaylistViewController per uniformare la gestione del singolo bottone Play e centralizzare la strategia nella barra di riproduzione.

CONTINUE *Cosa dobbiamo continuare a fare*

Continuare a seguire il processo Scrum con sprint planning, daily standup e sprint review.

Continuare ad applicare i pattern architetturali MVC e Observer per mantenere alto disaccoppiamento e coesione.

Organizzare attività di team building per rafforzare la collaborazione tra i membri.

Condurre daily standup meeting per mantenere allineamento continuo sullo stato dei task.

MORE *Cosa dobbiamo fare di più*

Sincronizzazione preventiva sulle funzionalità da implementare prima di avviare lo sprint.

→ Per lo Sprint 3 le interfacce con tutti i metodi (Command, CommandManager, AutoPlaylistGenerator, estensioni a Track e Playlist) sono state definite e concordate collettivamente prima dell'assegnazione dei task.

Discussione e validazione collettiva dei pattern architetturali prima dell'inizio dell'implementazione.

→ I pattern Command e Factory Method sono stati analizzati, discussi e approvati dal team prima dell'avvio dello Sprint 3, con mappatura esplicita dei ruoli canonici sui componenti del sistema.

START *Cosa dobbiamo iniziare a fare*

Definire la struttura della UI in modo condiviso prima di iniziare lo sviluppo, tramite wireframe o mockup concordati tra tutti i membri.

→ Per lo Sprint 3 il mockup della sezione Playlist Automatiche e del pannello di aiuto contestuale (T47) sono stati concordati prima dell'assegnazione dei task, evitando rework a posteriori.

Introdurre un design meeting fisso all'inizio di ogni sprint per congelare le interfacce condivise tra i moduli prima dell'implementazione.

→ Adottato come cerimonia aggiuntiva prima del primo daily dello Sprint 3, con durata stimata di 30–45 minuti.

Action Items (Sprint 2 → Sprint 3)

Azione

Definire le interfacce condivise collettivamente prima dell'avvio dello sprint.

Tenere un design meeting all'inizio dello sprint per concordare la struttura della UI.

Validare i pattern architetturali in gruppo prima dell'implementazione.
