

Sprint Review Report — Sprint 1

Music Playlist Manager

Gruppo 04 | Corso: Software Architecture Design | A.A. 2025/2026

Sprint	Data inizio	Data fine	Durata
Sprint 1	28 maggio 2026	04 giugno 2026	1 settimana

Story Points: Pianificati vs Completati

User Story	SP Pianificati	SP Completati	Stato
US01 — Creazione Tracce	3	3	Completata
US02 — Modifica Tracce	3	3	Completata
US03 — Eliminazione Tracce	3	3	Completata
US04 — Visualizzazione Tracce	3	3	Completata
US05 — Creazione Playlist	3	3	Completata
US06 — Rinomina Playlist	3	3	Completata
US07 — Eliminazione Playlist	3	3	Completata
US08 — Aggiunta Brano a Playlist	3	3	Completata
US09 — Eliminazione Brano da Playlist	3	3	Completata
US18 — Refresh Automatico Catalogo	5	5	Completata
US20 — Refresh Automatico Playlist	5	5	Completata
Totale	37	37	—

Velocity Sprint 1: 37 SP completati su 37 pianificati. Trattandosi del primo sprint, questa velocity verrà usata come riferimento per la pianificazione dello Sprint 2.

Problemi Implementativi

- **Mancanza di convenzioni di denominazione:** il team non aveva concordato preventivamente se usare l'inglese o l'italiano per i nomi di metodi, variabili e attributi. Questo ha causato inconsistenze tra le classi sviluppate dai diversi membri richiedendo refactoring. Per gli sprint successivi il team ha concordato di usare **l'inglese** per tutti i nomi nel codice e **l'italiano** per i commenti e la documentazione.

Problemi sul Product Backlog

- L'unico problema riscontrato, ma che abbiamo prontamente risolto, è stato l'uso di User Stories troppo complesse. Tuttavia, abbiamo provveduto a cambiarle già dalla fase di Pre-Game.

Burndown Chart Sprint 1

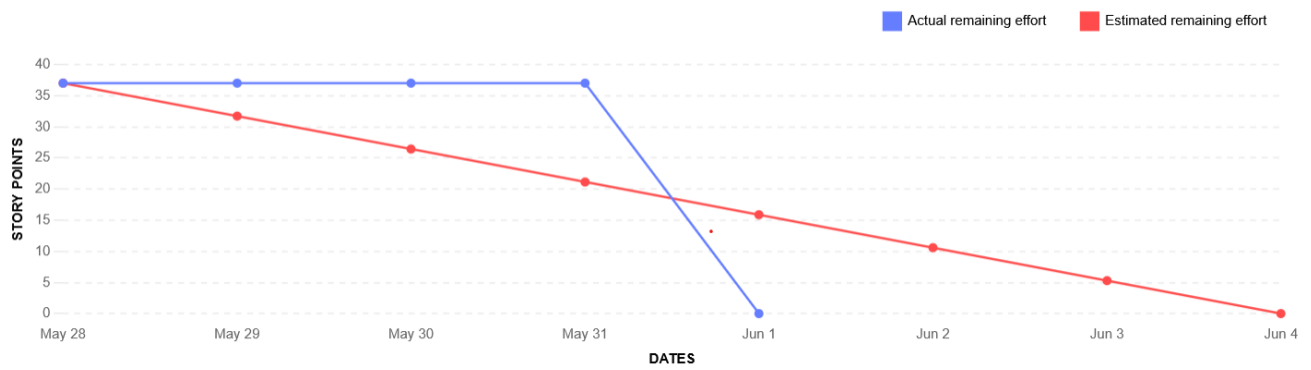


Figura 1: Burndown Chart Sprint 1

Extended Burndown Chart

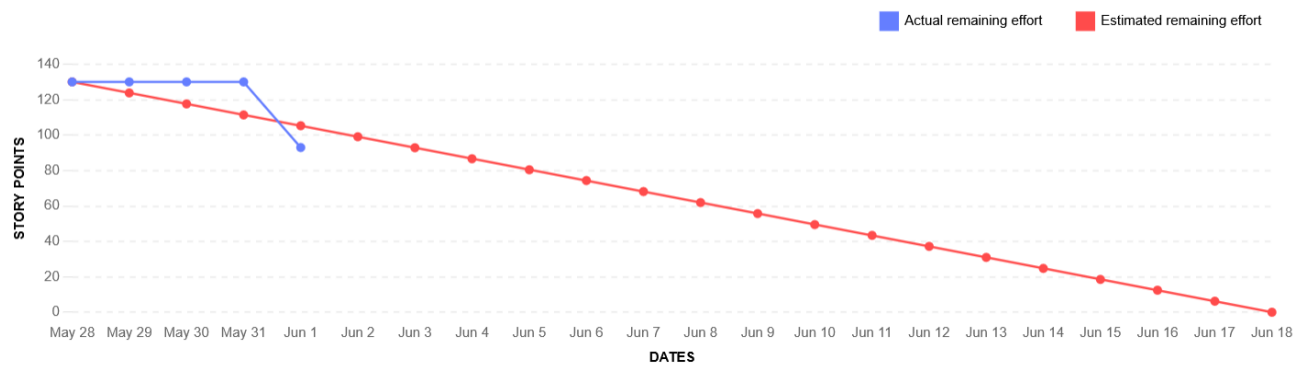


Figura 2: Extended Burndown Chart

Starfish Diagram

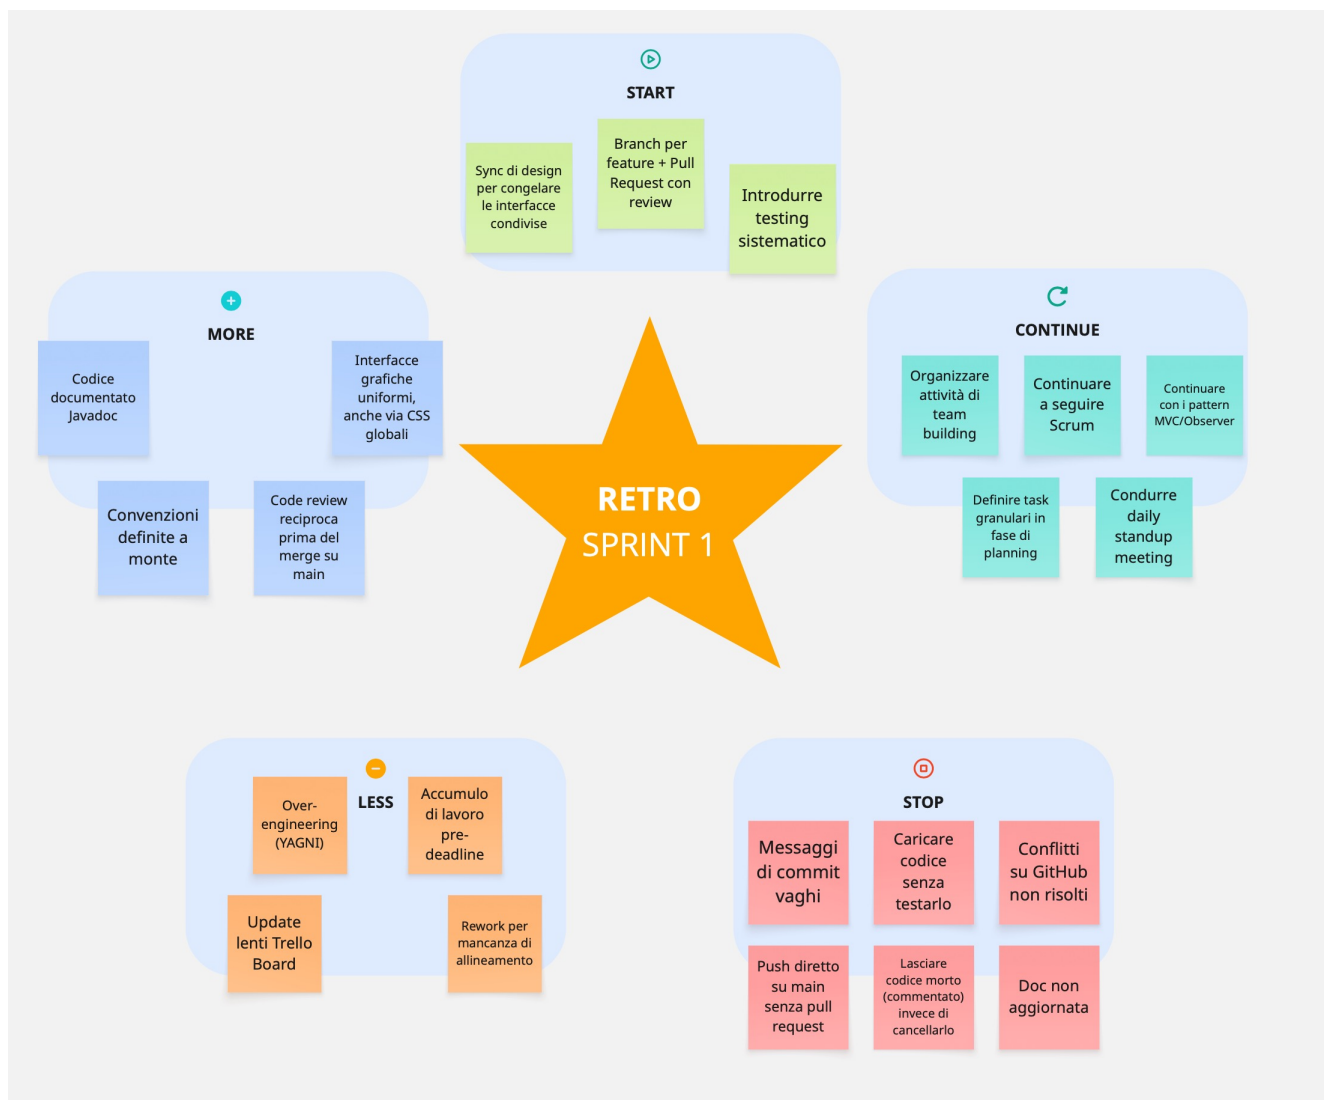


Figura 3: Starfish Diagram Sprint Retrospective 1

Action item (Sprint 1 → Sprint 2)

Dalla retrospective sono emersi i seguenti impegni operativi per lo sprint successivo:

Azione	Criterio di completamento
Branch per feature + Pull Request: niente push diretto su <code>main</code> ; ogni feature su un branch, merge solo tramite PR con almeno una review.	Zero commit diretti su <code>main</code> durante lo sprint.
Sync sulle interfacce: prima di implementare i moduli che si toccano, 15 minuti per congelare firme, ritorni ed eccezioni.	Le interfacce condivise non cambiano a metà sprint.
