

Sprint Review Report — Sprint 3

Music Playlist Manager

Gruppo 04 | Corso: Software Architecture Design | A.A. 2025/2026

Sprint	Data inizio	Data fine	Durata
Sprint 3	11 giugno 2026	18 giugno 2026	1 settimana

Ruoli Scrum

Ruolo	Membro
Scrum Master	Annamaria
Product Owner	Luigi

Story Points: Pianificati vs Completati

User Story	SP Pianificati	SP Completati	Stato
US22 — Undo delle Operazioni	8	8	Completata
US23 — Frequenza di Riproduzione Tracce	5	5	Completata
US24 — Frequenza di Riproduzione Playlist	5	5	Completata
US25 — Gestione dei Tag	5	5	Completata
US26 — Generazione Automatica di Playlist	8	8	Completata
US27 — Ordinamento della Playlist	13	13	Completata
Totale	44	44	—

Velocity Sprint 3: 44 SP completati su 44 pianificati. La velocity si è mantenuta allineata alla stima iniziale; l'intero backlog di media e bassa priorità è stato completato entro lo sprint finale del progetto.

Problemi Implementativi

- **Estensione dello scope del CommandManager a moveTrack (US27):** i criteri di accettazione di US22 specificavano l'undo per le sole operazioni di aggiunta e rimozione di tracce e playlist. Durante l'implementazione è emersa la necessità di rendere annullabile anche l'operazione di riordinamento (US27), non originariamente coperta da US22. La decisione, presa in corso di sprint tramite accordo del team, ha richiesto la progettazione di `MoveTrackInPlaylistCommand` e la modifica di `PlaylistImpl.moveTrack()` affinché restituisse l'indice originale necessario all'operazione di undo, con conseguente aggiornamento delle interfacce condivise già definite nel design meeting iniziale. Il Product Backlog è stato aggiornato per riflettere il nuovo criterio di accettazione in US27.
- **Collocazione e attivazione delle Playlist Automatiche nella UI (US26):** i criteri di accettazione di US26 non specificavano come l'utente avrebbe dovuto attivare la generazione automatica delle playlist. Durante l'implementazione è emerso che era necessario un elemento di interfaccia dedicato per la selezione del criterio di generazione (genere, anno, tag): non esisteva ancora nessuna tendina o controllo che permettesse all'utente di scegliere tra i generatori disponibili. È stata quindi aggiunta una sezione apposita con una tendina di selezione del criterio, non prevista nel mockup concordato a inizio sprint, che ha richiesto un accordo aggiuntivo tra i membri del team sulla struttura della vista.

- **Bug nelle modalità di riproduzione come debito tecnico pregresso:** in fase di test delle nuove funzionalità sono emersi bug nel comportamento delle modalità sequenziale, shuffle e loop durante la transizione tra tracce e playlist, riconducibili a debito tecnico accumulato in uno sprint precedente in cui il coordinamento sul layer di riproduzione non era stato ottimale. La risoluzione ha richiesto modifiche a `PlaybackController` e alle tre implementazioni della strategia (`SequentialStrategy`, `ShuffleStrategy`, `LoopStrategy`), con l'aggiunta di metodi non previsti originariamente per questo sprint.

Problemi sul Product Backlog

- **Estensione di US27 con criterio di accettazione relativo all'undo:** a seguito della decisione di rendere annullabile l'operazione di riordinamento tramite `MoveTrackInPlaylistCommand`, i criteri di accettazione di US27 sono stati aggiornati aggiungendo: *"DC sono nell'applicazione e ho riordinato le tracce di una playlist, Q premo il pulsante Undo, A la traccia torna alla posizione originale all'interno della playlist"*. La modifica è stata gestita tramite accordo esplicito del team, in linea con le azioni correttive adottate a seguito della Sprint Retrospective 2.

Code Review

Revisore	Autore	Classi da revisionare
Luigi	Gioia	<code>Command</code> (interfaccia), <code>AddTrackCommand</code> , <code>RemoveTrackCommand</code> , <code>AddPlaylistCommand</code> , <code>RemovePlaylistCommand</code> , <code>AddTrackToPlaylistCommand</code> , <code>RemoveTrackFromPlaylistCommand</code> , <code>MoveTrackInPlaylistCommand</code> (T34), <code>PlaylistImpl.moveTrack()</code> (T43), <code>HelpPanelViewController</code> (T47)
Gioia	Francesco	<code>TrackImpl/PlaylistImpl</code> play count (T37), <code>HomeController</code> (T38), <code>TrackImpl</code> tag + <code>TagType</code> (T39), display tag in <code>TrackListViewController</code> e <code>PlaylistDetailViewController</code> (T40), <code>AutoPlaylistView</code> e integrazione controller (T42), riordinamento in <code>PlaylistDetailViewController</code> (T44)
Francesco	Annamaria	<code>AutoPlaylistGenerator</code> , <code>GenrePlaylistGenerator</code> , <code>YearPlaylistGenerator</code> , <code>TagPlaylistGenerator</code> (T41), <code>AutoPlaylistGeneratorTest</code> (T46)
Annamaria	Luigi	<code>CommandManager</code> (T35), bottone Undo nella UI (T36), <code>CommandManagerTest</code> e test per ciascun <code>ConcreteCommand</code> incluso <code>MoveTrackInPlaylistCommand</code> (T45)

Burndown Chart Sprint 3

Burndown chart

Sprint 3

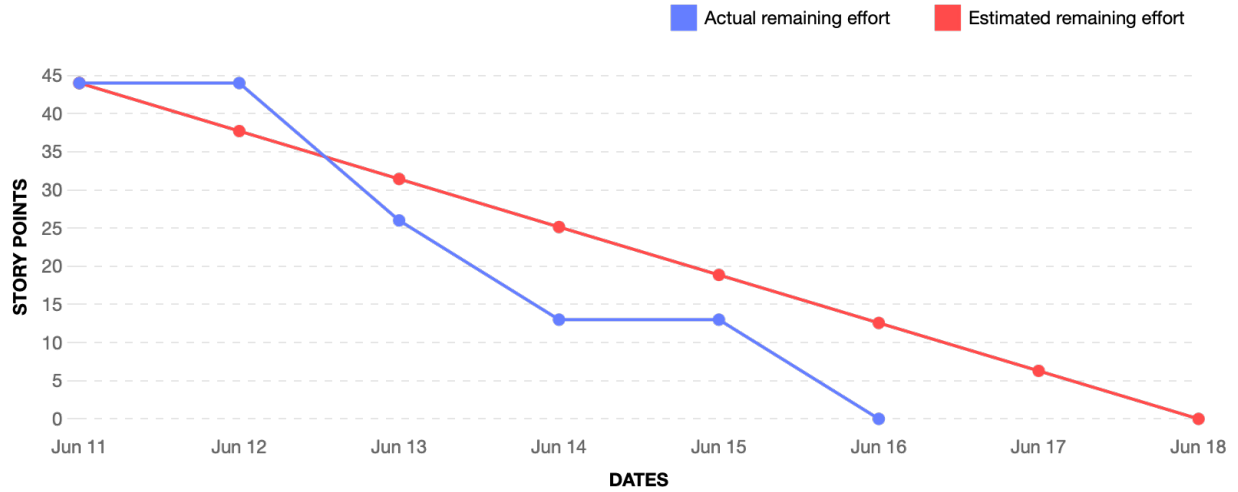


Figura 1: Burndown Chart Sprint 3

Extended Burndown Chart

Burndown chart

Progetto

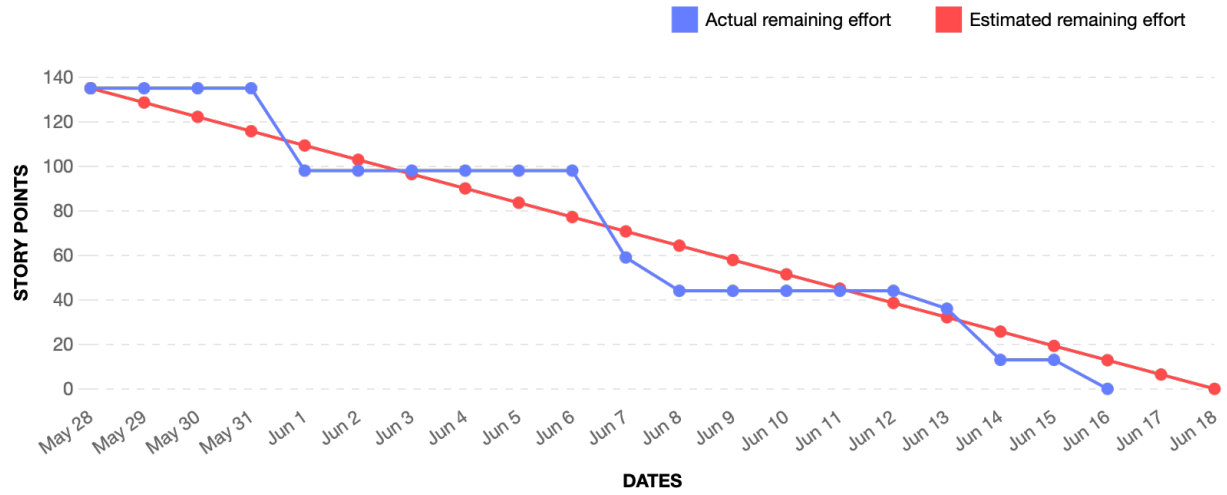


Figura 2: Extended Burndown Chart
