

Sprint Review Report — Sprint 2

Music Playlist Manager

Gruppo 04 | Corso: Software Architecture Design | A.A. 2025/2026

Sprint	Data inizio	Data fine	Durata
Sprint 1	5 giugno 2026	11 giugno 2026	1 settimana

Ruoli Scrum

Ruolo	Membro
Scrum Master	Gioia Isabelle Iannuzzi
Product Owner	Francesco Musto

Story Points: Pianificati vs Completati

User Story	SP Pianificati	SP Completati	Stato
US10 — Riproduzione e Pausa Tracce	3	3	Completata
US11 — Skip Tracce	3	3	Completata
US12 — Modalità Sequenziale (Playlist)	5	5	Completata
US13 — Modalità Shuffle (Playlist)	5	5	Completata
US14 — Modalità Loop (Playlist)	5	5	Completata
US19 — Persistenza dello Stato	8	8	Completata
US21 — Refresh Automatico Riproduzione	5	5	Completata
US28 — Skip Playlist Intera	5	5	Completata
US15 — Modalità Sequenziale (Catalogo)	5	5	Completata
US16 — Modalità Shuffle (Catalogo)	5	5	Completata
US17 — Modalità Loop (Catalogo)	5	5	Completata
Totale	54	54	—

Velocity Sprint 2: 54 SP completati su 34 pianificati. La velocity è aumentata rispetto allo Sprint 1 grazie all'aggiunta in corso di sprint delle US15, US16, US17 e US28.

Problemi Implementativi

- **Rivalutazione del pattern Composite:** in fase di progettazione era stato ipotizzato l'utilizzo del pattern *Composite* tramite l'interfaccia `PlayableSource`, al fine di trattare in modo uniforme tracce singole, playlist e catalogo come sorgenti riproducibili. Durante l'implementazione è emerso che nel dominio del progetto non esiste una gerarchia ricorsiva parte-tutto — una playlist non contiene altre playlist e il catalogo non contiene altri cataloghi — condizione necessaria affinché il Composite apporti un reale vantaggio architetturale. Il pattern è stato quindi scartato in favore del semplice polimorfismo: `PlayableSource` è rimasta come interfaccia comune ma senza la struttura ricorsiva tipica del Composite.

Problemi sul Product Backlog

- **Aggiunta di US28 — Skip Playlist Intera:** durante lo sprint è emerso che la funzionalità di skip dell'intera playlist, non era stata inclusa nel backlog iniziale. La user story è stata aggiunta e completata nel corso dello sprint.
- **Aggiunta di US15, US16, US17 — Modalità di riproduzione dal Catalogo:** grazie ad una velocity superiore al previsto (54 SP completati rispetto ai 34 pianificati), il team ha potuto anticipare le user story relative alle modalità di riproduzione sequenziale, shuffle e loop dal catalogo, originariamente previste per lo Sprint 3. L'implementazione è risultata poco onerosa in quanto riutilizza le stesse strategie già sviluppate per le playlist (US12, US13, US14), modificando esclusivamente la sorgente delle tracce.

Code Review

Revisore	Autore	Classi da revisionare
Gioia	Annamaria	PlaybackBarController (T25), PlaybackBarView.fxml (T25), AutoSaveObserver (T29), PersistenceManagerTest (T32)
Annamaria	Luigi	PlaybackState (T21), PlayingState, PausedState, StoppedState (T21), PlayableSource
Luigi	Francesco	SequentialStrategy, ShuffleStrategy, LoopStrategy (T22), PersistenceManager (T28), PlaybackStrategyTest (T30)
Francesco	Gioia	PlaybackController (T23, T24), PlaybackControllerTest (T31)

Burndown Chart Sprint 2

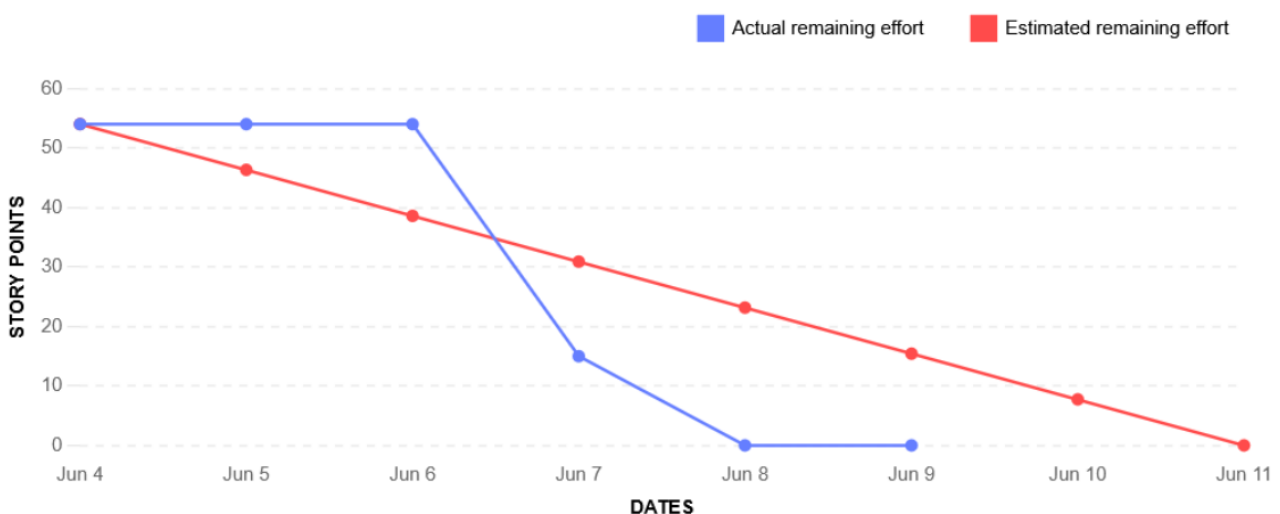


Figura 1: Burndown Chart Sprint 2

Extended Burndown Chart

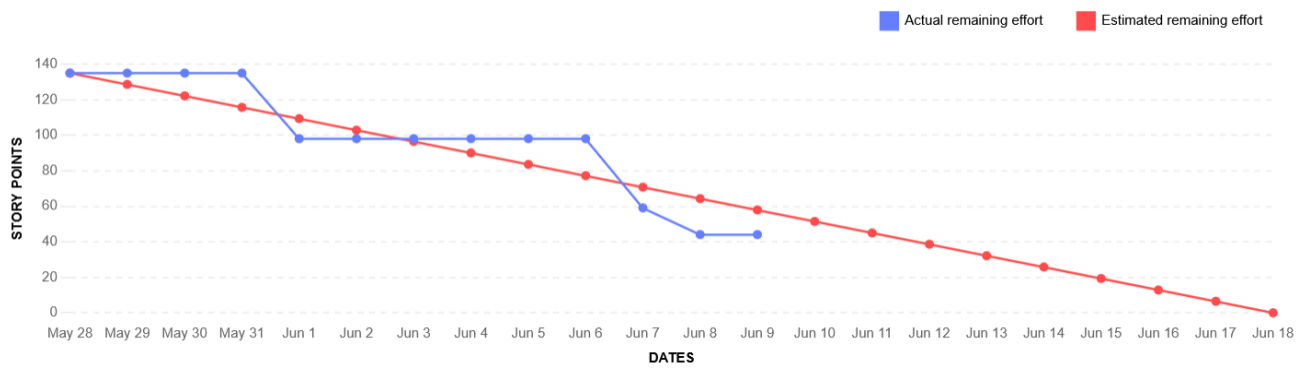


Figure 2: Extended Burndown Chart
